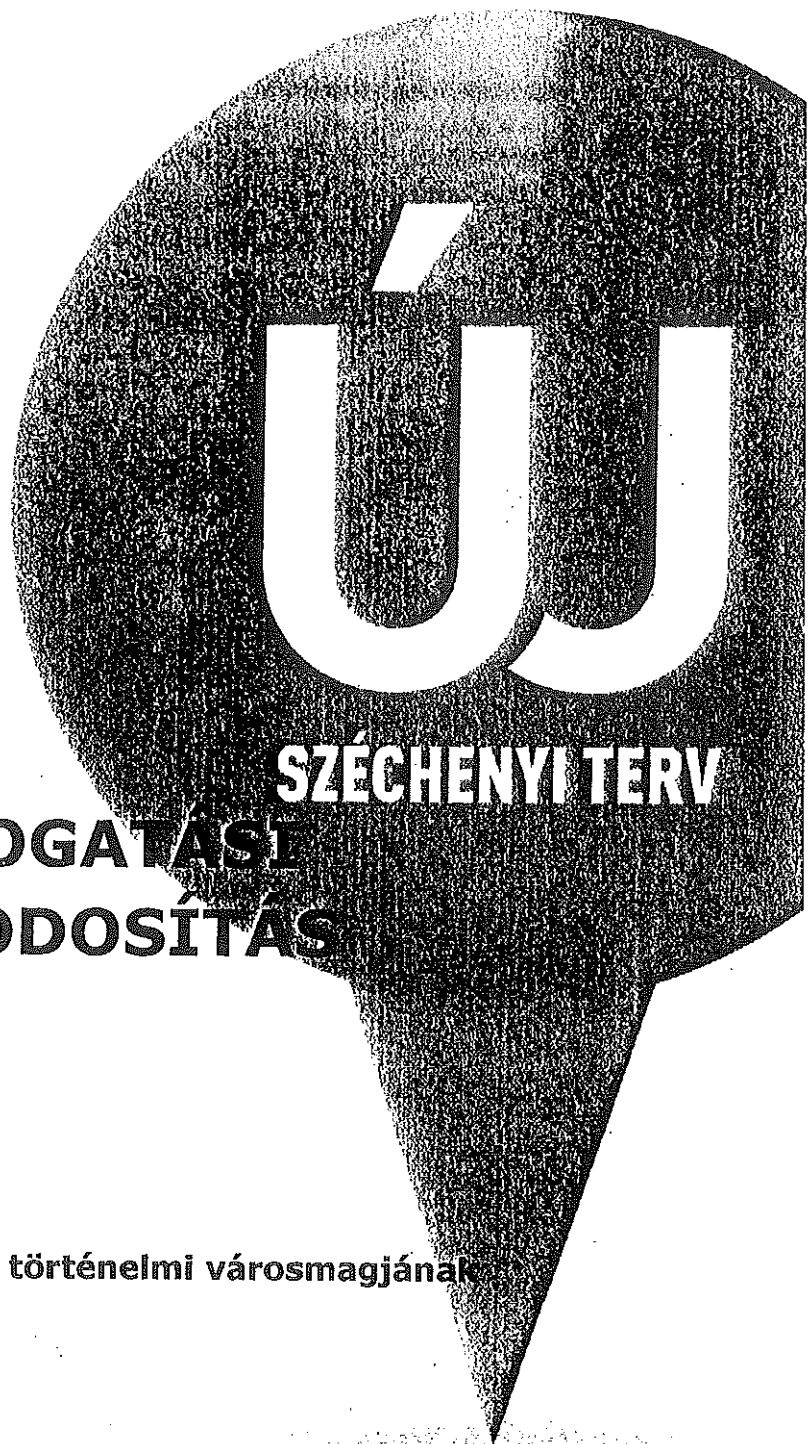


ÉRKEZETT

2014. MÁRC. 19.



6. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

SZÉCHENYI TERV

„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbővítő fejlesztése”

Azonosító szám:

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyierv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Azonosító szám: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Székhely:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Sitányi László, ügyvezető
Azonosító szám (Cégjegyzékszám):	02-09-073171
Adószám/adóazonosító jel:	20145103-2-02

másrészről

Név/Cégnév: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint kedvezményezett** (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Székhely/Lakcím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Azonosító szám (törzs-szám):	416560
Adószám/adóazonosító jel:	15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	11746005-15416566-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:	Horváth István polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek 2011. december 29-én a „**Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése**” című projektre, **DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2013.04.05-én a kiemelt projektek előrehaladásának szorosabb nyomonkövethetősége érdekében a negyedéves pénzügyi vállalások és a cselekvési ütemterv havi bontásában, 2013.06.17-én a Piac téren tervezett beruházások műszaki tartalom változásának, 2013.08.16-án az ÁFA kompenzáció, 2013.12.02-án költségnövekmény, 2014.02.04-én a projekt tervezett befejezési határidejének módosítása vonatkozásában módosítottak.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a **Támogatási Szerződést az alábbiak szerint** módosítják:

I



Hatályos szöveg:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tényleges kezdő időpontja: **2012. év 09. hó 26. nap.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles az ok megjelölésével haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a szerződéskori tervezett időponttól számított három hónap, amennyiben a késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki a Kedvezményezett.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2014. év 12. hó 31. nap**

A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, valamennyi támogatott tevékenység elvégzésre került.

A záró elszámolási csomag (záró kifizetési igénylés és záró projekt előrehaladási jelentés) benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 30nap.

3.3.2. Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, és a kedvezményezett záró elszámolási csomagját a támogató jóváhagyta, és a jóváhagyott támogatási összeget kifizette.

3.3.3. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült.

3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.5. Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 7100 Szekszárd, belterület: Béla király tér (hrsz: 1787 és 1820/1), Várkör köz (hrsz:1819 és 1821), Piactér (hrsz: 1822/2) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a 3.3.2 pont szerinti befejezés napját követően kezdődő 5 éves fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.**





4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban körüírt Támogatási Szerződés 6. sz. mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. sz. melléklet – Eltérések listája

5. Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás) minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata P.H. Kelt Szekszárd, 2014. év 03. hónap 11. napján.</p>	<p> DDRFÜ Nonprofit Kft. P.H. Kelt Kaposvár, 2014. év 03. hónap 11. napján.</p>
--	--



Eltérések listája

1. számú melléklet

Közösségi ház kiúbhelység B 115:
 - kávégep bruttó 124.844 Ft,
 - hűtőszekrény bruttó 116.125 Ft;
 Közösségi Ház büfé:
 Nem elszámolható tételek:
 szerepel.

• A közösségi Ház tervezett eszközbeszerzése között több nem elszámolható tétel

A Döntés Előkészítő Bizottság a projektet az alábbi feltétellel támogatata:

III. A projekt műszaki tartalmát érintő eltérések:

A Projekt minden egyéb jellemzője változatlan marad.

A Támogatási szerződés 1.- 11. sz. mellékletei kitöltésre kerültek.

2.) Mellékletek megadása:

A Projekt kivitelezését a támogatási szerződés hatálya lépését követően tervezni megkezdeni a Kedvezményezett.

Projekt adatapon megadott dátumok		Tervezett dátumok (Támogatási szerződésben)	
Kezdési időpont	2011.03.02.	Kezdési időpont (tervezett)	2011.10.03.
Befejezési időpont	2012.12.13.	Befejezési időpont	2014.10.02.
Időtartam	21 hónap	Időtartam	36 hónap

1.) A Projekt tervezett kezdési időpontja a következőképpen módosul:

eltérések:

II. A Projekt jellemzőit a Támogatási szerződés megkötése előtt érintő

1.) A Kedvezményezett minden egyéb adata változatlan marad.

00000000

Bankszám, amelyre a támogatás utalása történik: 11746005-15416566-

előtt érintő eltérések:

I. A Kedvezményezett azonosító adatait a Támogatási szerződés megkötése

Kedvezményezett által benyújtott, DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben foglaltakhoz képest a projekt az alábbi eltérésekkel valósítandó meg:

Projekt azonosító száma:	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
Projekt címe:	"Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése"
Kedvezményezett:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett székhelye:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Aláírási jogosult képviselője:	Horváth István polgármester

Mellékletek listája

A projektmenedzsment tevékenység projektgazdája a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. nettó elszámolási az AFA nyilatkozata alapján, így az ezen tevékenységre betervezett AFA, 19 250 000 Ft elszámolható költség csökkentésre javasolt (85%-os támogatással, javasolt támogatáscsökkentés: 16 362 500 Ft).
 A Béla király térre tervezett szobor (21 250 000 Ft) költségének alátámasztására becsatolt képviselő-testületi határozatban 12 000 000 Ft szerepel, tehát az alátámasztás nem teljes körű. A kifogásban benyújtott képviselő-testületi határozat dátuma későbbi a projektjavaslat befogadási dátumánál, így alátámasztásként nem elfogadható. Javasolt elszámolható költségcsökkentés:

Eszközbeszerzés javasolt elszámolható költség csökkentése összesen: bruttó 2 496 678 Ft (85%-os támogatással, javasolt támogatáscsökkentés: 2 122 177 Ft).
 A nem elszámolhatóság indoka:

- nem sorolható be az útmutató elszámolható költségek közé;
 - nem alapműködéséhez szükséges eszköz;
 - fogyóeszköz, készlet.
- A nem elszámolhatóság indoka:
- tartalék fenntartások bruttó 60.000 Ft.
 - Közösségi ház - világszínház (színház próbaterem):**
 - 3 db hosszabbító 5 m-es bruttó 4.763 Ft.
 - 3 db hosszabbító 3 m-es bruttó 3.750 Ft;
 - 3 db hosszabbító 20 m-es bruttó 7.500 Ft;
 - Közösségi ház audiovizuális eszközök:**
 - 10 db lábtörő bruttó 37.500 Ft.
 - 10 db konyharuha bruttó 24.988 Ft;
 - 20 db asztalterítő bruttó 99.750 Ft;
 - 10 db törölköző bruttó 15.300 Ft;
 - 4 db paplan bruttó 60.000 Ft;
 - 4 db ágynemű garnitúra bruttó 69.950 Ft;
 - Közösségi ház rakár B 213:**
 - 40 db müanyag táca bruttó 72.950 Ft.
 - 120 db pohár bruttó 43.350 Ft;
 - edénykészlet bruttó 16.238 Ft;
 - 12 db-os étkészlet bruttó 62.475 Ft;
 - mosógép bruttó 124.875 Ft;
 - villanyreszó bruttó 10.629 Ft;
 - vízforraló bruttó 9.363 Ft;
 - mikrohullámú sütő bruttó 18.750 Ft;
 - hűtőgép bruttó 87.375 Ft;
 - Közösségi ház teakonyha:**
 - tanári szék bruttó 11.025 Ft.
 - tanári asztal bruttó 25.000 Ft;
 - stereo mikroszkop bruttó 658.000 Ft;
 - zöld fallábba bruttó 19.788 Ft;
 - 20 db tanulóasztal bruttó 250.000 Ft;
 - Közösségi ház klubhelység B 210:**
 - társasjáték bruttó 12.500 Ft.
 - dominó bruttó 4.000 Ft;
 - sakk és backgammon bruttó 5.990 Ft;
 - csocsó asztal bruttó 150.000 Ft;
 - biliárd asztal bruttó 250.000 Ft;
 - ping-pong asztal bruttó 39.900 Ft;

Sor- szám	A műszaki tartalmat érintő változás megnevezése, tartalma		Változás elrendelője	A változás típusa és értéke Ft-ban				Megjegyzés
	Tétel megnevezése	Új tétel megnevezése		Csökkenő tartalom	Növekvő tartalom (önerő)	Növekvő tartalom (elszámolható)	Helyettesítő tartalom (megtakarítás)	
Közműkiváltások								
1.	Béla tér 7. sz. alatt gázvezeték korrodálódott, cseréje szükséges	Új középnyomású gázvezeték	Eon		- 384 456			Feltárás során derült ki, Eon szerelelt végzte, a föld és helyreállítási munkákat a kivitelező, a megrendelő utasítására. Pályázatban nem támogatott műszaki tartalom.
2.	-	Béla téren új elzáró képzése szükséges	Eon		- 386 036			Feltárás során derült ki, Eon szerelelt végzte, a föld és helyreállítási munkákat a kivitelező, a megrendelő utasítására. Pályázatban nem támogatott műszaki tartalom.
Közmű csatornaépítés								
3.	Költségvetésben 33 m-el több folyóka beépítése szerepel mint a terveken	Terveken szereplő mennyiségek kerülnek beépítésre	Megrendelő	- 1 165 725				A költségvetés pontosítása, kiligazítása szükséges. Megtakarítás.
4.	A költségvetésben nem szerepel a terveken szereplő vizgépészeti aknáredlap	A terv szerinti állapot szerepeljen a költségvetésben, a tedlap megépül	Megrendelő			74 013		A költségvetés pontosítása, kiligazítása szükséges. A költségvetés szempontjából növekvő tartalom.

M

Köbúrkolat készítés

5.	Megveháza és Hivatal előtt Bazalt kiskockaköbúrkolat	Semmelrock Einstein Antracit burkolat	Megrendelő						5 707 220	Költségcsökkentéssel járó helyettesítő műszaki tartalom. Megtakarítás
6.	Semmelrock süllyesztett szegély	Bazalt nagykocka szegély	Megrendelő						8 617 922	Költségnövekedéssel járó helyettesítő műszaki tartalom.
7.	Semmelrock kerți szegély 814,34 m épül	Semmelrock kerți szegély 814,34 m nem épül meg	Megrendelő	-	3 075 763					A költségvetésben a tervekhez képest több kerți szegély szerepelt. A költségvetés pontosítása szükséges. Költségcsökkentés. Megtakarítás
8.	Aszfalthoz kapcsolódó, meglévő beton szegélyhez bazalt kövek	Bazalt helyett betonszegély épül	Megrendelő						78 831	Költségnövekedéssel járó helyettesítő műszaki tartalom.
9.	Munkácsy utca torkolatánál balra kanyarodást tiltó tábla	Vizuális megerősítésként süllyesztett szegély	Megrendelő						659 461	Közlekedés biztonsági javító megoldás. Műszaki tartalom, és költségnövekedés.
10.	Bartina-Babits utca torkolatában térburkolat épül	Bartina-Babits utca torkolatában aszfalt épül	Megrendelő						35 382	Költségnövekedéssel járó helyettesítő műszaki tartalom.
11.	Gyalogátkelőhelyek térburkolattal, aszfalttal	Taktilis kövek elhelyezése gyalogátkelőkhöz	Rehabilitációs szakmémók						745 568	Műszaki tartalom növekedés, költségnövekedéssel járó szakmémók előírása, akadálymentesítéshez szükséges

12.	Béla tér 7. sz. alatt kocsibehajtó kiskocskakó burkolattal	Béla tér 7. sz. alatt kocsibehajtó Semmelrock Einstein Antracit burkolattal	Megrendelő						256 815	Költségcsökkentéssel járó helyettesítő műszaki tartalom. Megtakarítás
13.	Flórián utcai csomópontban gyalogátkelőhely épül	Flórián utcai csomópontban forgalomlassítás, burkolatkiemeléssel	Építésiügyi hatóság							Műszaki tartalom csökkentés, funkció csökken, a beépített anyagok mennyisége azonban nem. Költségvonzat nincs.
Támfal építés										
14.	Bezeređj utca 2. szám előtt parkoló	Bezeređj utca 2. szám alatt mozgáskorlátozott parkoló, kiszálló sávval	Rehabilitációs szakmérnök							Kiszálló sáv készült eltérő színű lő beépítésével. Műszaki tartalom növekedés, költségvonzata nincs
15.	Vármegyeháza kertjében támfal épül, a fák gyökereinek átvágásával	A támfal tükrözve épül meg, a kiugrás egy elpusztult fa helyére	Megrendelő							Helyettesítő műszaki tartalom, költségvonzata nincs.
16.	Várkert gyalogos híd mellé támfal	A híd alapozása csak úgy megoldható, ha a híd egy kicsit elfordul, és emiatt a támfal is elfordul	Megrendelő							Helyettesítő műszaki tartalom, költségvonzata nincs.

17.	Várkertben a híd előtt terasz épül	A terasz vízelvezetéséhez a mellvédfaljának tövébe folyódka épül	Megrendelő				Műszaki tartalom növekedés, költségnövekedéssel nem jár.
18.	Megyecimer felett támfal épül	A támfal két végéhez további támfalak épülnek	Megrendelő		522 133		Műszaki tartalom növekedés, költségnövekedéssel jár.
19.	Várköz lépcső mellett legalsó támfal és növénysziget épül	Támfal a megyecimer fölött épül, növénysziget helyett járda épül	Megrendelő	522 004			Műszaki tartalom csökkenés, költségcsökkenéssel jár.
Vízi közművek építése							
20.	V-1-0-0 vízvezeték épül	V-1-0-0 vízvezeték utolsó 15 m-es szakasza nem épül meg	Megrendelő			95 037	Helyettesítő műszaki tartalom, megtakarítással jár, minden funkció megvalósul, ellátásra kerül.
21.	A költségvetésben a tervekhez képest 16+32 db víznyelő akna létesítése szerepel	A terveken szereplő mennyiségű akna épült meg, 48 db elhagyható	Megrendelő	862 560			A költségvetés pontosítása szükséges, költségcsökkenéssel jár a változás, azaz megtakarítás keletkezik.
22.	Babits utcai vízvezeték áthelyezése, feltárása	A feltárt vezeték cseréje szükséges	Vízművek		463 764		Műszaki tartalom növekedés - költségnövekedés.

3

23.	Béla tér 6. szám előtt II. Jeli akna építése	Béla tér 6. szám előtt II. Jeli akna építése nem szükséges	Megrendelő					235 087	Helvettesítő műszaki tartalom, megtakarítással jár, minden funkció megvalósul, ellátásra kerül.
24.	Béla tér 6. és 7. szám előtti szennyvízdekötés	A bekötéshez segédgerinc megépítése szükséges	Megrendelő			1 167 369			Műszaki tartalom növekedés - ölségénövekedés.
25.	CS-2-0 csapadékcatorna építése	CS10 és CS8 aknák között nem épül meg a egy 15m-es szakasz	Megrendelő				307 362		Helvettesítő műszaki tartalom, megtakarítással jár, minden funkció megvalósul, ellátásra kerül.
26.	CS-2-0 csapadékcatorna építése	CS12 és CS5 aknák között a csapadékcatorna cseréje szükséges	Megrendelő			328 329			Műszaki tartalom növekedés - költségnövekedés.
27.	CS-1-0 Csapadékcatorna szakaszon CS6 Jeli akna, előregyártott	CS-1-0 Csapadékcatorna szakaszon CS6 Jeli akna monolit akna, folyóka rákötéssel	Megrendelő				433 199		Költségnövekedéssel járó helyettesítő műszaki tartalom.
28.	Bezerédy utca melletti folyóka bekötése	Bezerédy utca melletti folyóka bekötés nyomvonala változik	Megrendelő				124 944		Költségnövekedéssel járó helyettesítő műszaki tartalom.

Elektromos munkák

29.	M294 kandaláber	M294 kandaláber albontásra és áthelyezésre kerül	Megrendelő					-	898 444	<p>Helystettesítı mőszaki tartalom, megtakarítással jár, minden funkció megvalósul, ellátásra kerül.</p>
30.	É254/4 kandaláber	É254/4 kandaláber áthelyezésre kerül	Megrendelő							<p>Helystettesítı mőszaki tartalom, költségvonzata nincs.</p>
31.	É293/1 kandaláber	É293/1 kandaláber áthelyezésre kerül M294 helyére	Megrendelő					-	50 610	<p>Helystettesítı mőszaki tartalom, megtakarítással jár, minden funkció megvalósul, ellátásra kerül.</p>
32.	Á293 kandaláber	Á293 kandaláber áthelyezésre kerül	Megrendelő							<p>Helystettesítı mőszaki tartalom, költségvonzata nincs.</p>
33.	M288 kandaláber	M288 kandaláber áthelyezésre kerül	Megrendelő						95 989	<p>Költségnövekedéssel járó helyettesítı mőszaki tartalom.</p>
34.	Szentháromság szobor körüli 5 db lámpatest	Szentháromság szobor körüli 5 db lámpatest áthelyezésre kerül	Megrendelő					-	1 131 679	<p>Helystettesítı mőszaki tartalom, megtakarítással jár, minden funkció megvalósul, ellátásra kerül.</p>
35.	Megyháza D-i oldalán MQ6 kandaláber	elmarad, helyette építı 6 db kis fpm kandaláber	Megrendelő						1 545 260	<p>Költségnövekedéssel járó helyettesítı mőszaki tartalom. Közlekedésbiztonsági szempontból szükséges.</p>
	Megyháza K-i oldalán 8 db fénycső	helyett 6 db padlólámpa, és 2 fénycső létesül	Megrendelő						636 780	<p>Költségnövekedéssel járó helyettesítı mőszaki tartalom. Közlekedésbiztonsági szempontból szükséges.</p>

3

Vármegyeháza NY-i oldalán 6 db padlólámpa	helyett 294/3 kandeláberre 2 db fényvető, 4 db új padlólámpa	Megrendelő				481 220	Helyettesítő műszaki tartalom, megalkarítással jár, minden funkció megvalósul, ellátásra kerül.
A286 jelű kandeláber a gyalogátkelőlhelynel	A286 jelű kandeláber a gyalogátkelőlhelynel áthelyezésre kerül	Megrendelő				31 077	Költségnövekedéssel járó helyettesítő műszaki tartalom. Közlekedésbiztonsági szempontból szükséges.
Összesen							
			- 5 626 052	- 770 492	3 960 637	2 435 910	

2

w



Kelt: Kaposvár, 2014. március

A Projekt minden egyéb műszaki tartalma változatlan marad.

Fentiek miatt a projekt elszámolható összköltsége és támogatástartalma nem változik.
