

Iktatószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Projekt címe: Sió turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-
00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Fehér János igazgató, Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzs-szám): **733568**

Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11746005-15416566-11670009**

Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számon regisztrált, 2017.05.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.12. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban



részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Sió turisztikai fejlesztése” című és TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a szerződés 10. sz. mellékletében részletezett helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.09.01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 08. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2020. év 12. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2018.09.01.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **100.000.000.- Ft**, azaz Egyszáz millió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **100.000.000.- Ft**, azaz Egyszáz millió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **100.000.000.- Ft**, azaz Egyszáz millió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **85.000.000.- Ft**, azaz Nyolcvanöt millió forint.



4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **100.000.000.- Ft**, azaz Egyszáz millió forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 100.000.000.- Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló



368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|---|---|
|  <p>Kedvezményezett P.H. Kelt Szekszárd, 2017. október 30.</p> <p><i>P.H. eljegyzés</i> 2017-10-30</p> |  <p>Támogató P.H. Kelt Szekszárd, 2017. október 30.</p> |
|---|---|

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE-1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Támogatást igénylő | Költség-kategória | Költség típus | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Beruházás hoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Vízi kiszállító építése, Külső közműellátás költsége, vízellátás költsége, Szilárd burkolatú út és parkolók és csapadékvíz elvezetése, a Síóhoz vezető út építése, Kapcsolódó kiszolgáló létesítmény: játszótér körbekerítése és aljzat kialakítása, fedett B+R kerékpártárolók térkő aljzatának építési költségei | 1 | 40 581 354 | 10 956 966 | 51 538 320 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Beruházás hoz kapcsolódó költségek | Eszköz beszerzés költségei | 1 db Udvari mozgásfejlesztő játék, 2 db fedett B+R kerékpártároló, 5 db Kültéri hulladék gyűjtő, felnyitható tetővel, csikkirtóval, 60L, 2 db Kültéri szelektív hulladékgyűjtő, zárható tetővel, 8 db Kerti gyermek bútor műanyag szék, 2 db Kerti gyermek bútor műanyag asztal, 4 szeméyes, 2 db Napernyő beton talppal, 10 db mobil árnyékoló, 6 db Kültéri íves pad, váz horganyzott acél, kültéri porszórt festéssel, ülőfelülete fenyő deszkázat, 4 db Kültéri pad, 3 szeméyes támlás, horganyzott fémvázazas, oldalai lézervégva, ülő és háttámlája kültéri lazúrozással kezelt tölgylecből készítve, 8 db kültéri használatra alkalmas kerti fekhely, 20 db Kerti székek támlával és karfával, sorolható, kültéri használatra alkalmas, nagy teherbírási szék, 5 db Terasz asztal, kültéri használatra alkalmas 4 szeméyes, nagy teherbírási, 1 db mobil grill állvány, 2 db mini és 1db családi mobil kerti tűzrakó | 1 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 |

1. oldal

87

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|-----------|---------|-----------|
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Egyéb projekt előkészítés hez kapcsolódó költség | Üzleti terv és marketingstratégia elkészítése | 1 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Egyéb projekt előkészítés hez kapcsolódó költség | Műszaki tervek költségei; engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése | 1 | 1 732 284 | 467 716 | 2 200 000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Közbeszerz ési költségek | Közbeszerzési eljárások díja | 2 | 196 850 | 53 150 | 500 000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Projekt menedzs- ment költség | Projekt menedzs- ment személyi jellegű ráfordítása | A projektmenedzsment tagok bérköltsége 3 fő/36 hónap mennyiséggel számolva | 1 | 2 049 180 | 0 | 2 049 180 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Projekt menedzs- ment költség | Projekt menedzs- ment személyi jellegű ráfordítása | A projektmenedzsment tagok foglalkoztatási járuléka 3 főre és 36 hónapra | 1 | 450 820 | 0 | 450 820 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Szakmai tevékenysé gekhez kapcsolódó szolgáltatá- sok költségei | Egyéb szolgáltatá- si költségek | Telekalakítási díjak a bekötőútra, A bekötő út építési engedélyezése használatba vétele > 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet alapján, A vízi kiszálló létesítési engedélyének költségei, vízbekötéssel kapcsolatos díjak | 1 | 599 748 | 161 932 | 761 680 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|-----------|---|-----------|
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Szakmai tevékenység gekhez kapcsolódó szolgáltatá- sok költségei | Kötelezően előírt nyilvános- ság biztosításá nak költsége | Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása | 1 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Szakmai tevékenység gekhez kapcsolódó szolgáltatá- sok költségei | Marketing, kommuniká ciós szolgáltatá- sok költségei | Média megjelenések vásárlása a projektekhez kapcsolódóan; TV, rádió és újságcikkek | 1 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Szakmai tevékenység gekhez kapcsolódó szolgáltatá- sok költségei | Marketing, kommuniká ciós szolgáltatá- sok költségei | Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése | 1 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Szakmai tevékenység gekhez kapcsolódó szolgáltatá- sok költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri tevékenység ellátása | 1 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzata | Tartalék | Tartalék | Tartalékkerei | 1 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |


B
T. Kovács

SZÉCHENYI 2020



89

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|------------|-----------|-------------|
| Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület | Beruházás hoz kapcsolódó költségek | Eszköz beszerzés költségei | 10 db 4 fős túrakenu, 8 db túra kajak 1 fős gyermekek részére, 5 db túra kajak 2 fős, 8 db túra kajak 1 fős felnőttek részére, 20 db kerékpár, 2 db kerékpártartó hangárba, 2 db kerékpártartó udvarra, 8 db lapát gyermek, 18 db lapát felnőtt, 40 db lapát túrakenu, 2 db 10 fős sárkányhajó, 25 db sárkányhajó lapát, 5 db hajótartó állvány, 60 db mentőmellény, 1 db kosárpalánk, 1 db röplabdaháló | 1 | 15 748 032 | 4 251 968 | 20 000 000 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: | | | | | | | 100 000 000 |



Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

P.H. elleni 1 órasat
2017-10-30

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. október 30.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

| Források: | (Ft) |
|--|-----------------------|
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 100 000 000.- |
| Összesen: | 100 000 000.-- |

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

P.H. előírta
 2017-10-30



Támogató

P.H.


Kelt: Szekszárd, 2017. október 30.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata


| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2018.09.01. | <p>Üzleti terv, marketingstratégia, TDM nyilatkozat, műszaki tervek, rendezett tulajdonviszonyok, tájékoztatás és nyilvánosság folyamatos biztosítása, projektmenedzsment felállítása, feladatok folyamatos ellátása.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00002457 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>Projektfejlesztés végére teljesítendő feltétel: A Felhívás 3.3e) pontja alapján kerékpár, (túra) kajak, (túra) kenu, sárkányhajó és hozzá tartozó lapát beszerzése nem támogatható. Továbbá a vásárolni kívánt kerékpárok tárolására alkalmas tároló szintén nem támogatható. Kérjük ennek alapján a költségvetés felülvizsgálatát és módosítását.</p> |
| 2 | 2019.03.01. | Lefolytatott közbeszerzési eljárások, aláírt vállalkozási szerződések, marketing tevékenység megkezdése. |
| 3 | 2019.07.01.. | A beruházás 25%-os készültségi szinten, az előkészítési munkálatok megtörténtek. |
| 4 | 2019.11.01. | A beruházás, az építési munkák 50%-os készültségi szinten. |
| 5 | 2020.05.01. | Az építési munkák, a beruházás készültségi szintje 75%. |
| 6 | 2020.08.31. | Beruházás 100% készenlétben a befejező munkálatok és a tereprendezeit követően, sikeres műszaki átadás-átvétel, projektzárás. |


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

Pe. elleg
 2017-10-30


 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. október 30.


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Onkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsít-hető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 2 | Lefolytatott közbeszerzés | Vállalkozási szerződések. | - | - | Aláírt vállalkozási szerződés építésre és eszközökre is. |
| 6 | Kivitelezés 100%-os készültségi szinten | Moduláris úszómű, szilárd burkolatú út, parkolók, kiépített vízellátás, játszótér és fedett kerékpártárolók. | - | - | Új turisztikai vonzerő megjelenése Szekszárdon. |
| 1 | Tartalmi-műszaki szempontból előkészített projekt | Üzleti terv, marketing stratégia, műszaki tervek, TDM nyilatkozat. | - | - | Rendezett tulajdonviszonyok, kiépített partnersegék-turisztikai is. |


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Onkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt Szekszárd, 2017. október 30.
P.H. Szekszárd, 2017. október 30.




 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. október 30.

Handwritten signature

5. sz. melléklet


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6-1.4-16-SE1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2017.05.31... | 0 | 2021.12.31. | 200 | 200 | 200 |
| A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2022.12.31. | 200 | 200 | 200 |
| A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2023.12.31 | 200 | 200 | 200 |



Handwritten signature

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----|-----|-----|
| A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2024.12.31. | 200 | 200 | 200 |
| A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2025.12.31 | 200 | 200 | 200 |

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Képviselet vezetője
 P. H.



P.H.
 Támogató

P.H.

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.
Pé. eljeg. T. eljeg.
 2017-10-30

Kelt: Szekszárd, 2017. október 30.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK¹


Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső** (*hivatalos képviselő neve*), mint Szekszárd MJV Önkormányzata (*Konzorciumi tag/konzorciumvezető neve*) képviseletében eljáró személy a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Sió turisztikai fejlesztése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a(z) Szekszárd MJV Önkormányzata (*Konzorciumi tag/konzorciumvezető neve*) az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § 1. bekezdésének C pontja² alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

¹ A nyilatkozatot releváns esetben kérjük kitölteni!

² Kérjük, hogy szíveskedjenek a releváns jogszabályhelyet megjelölni!



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK¹

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület**

Alulírott **Jámbor Attila** (*hivatalos képviselő neve*), mint Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület (*Konzorciumi tag/konzorciumvezető neve*) képviseletében eljáró személy a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Sió turisztikai fejlesztése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a(z) Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület (*Konzorciumi tag/konzorciumvezető neve*) az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § 1. bekezdésének m) pontja² alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Szekszard, 2017. év ...10... hónap 20 napján

SZEKSZÁRDI KAJAK-KENU SE
7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9.
Adószám: 15020760-1-17

¹ A nyilatkozatot releváns esetben kérjük kitölteni!

² Kérjük, hogy szíveskedjenek a releváns jogszabályhelyet megjelölni!



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

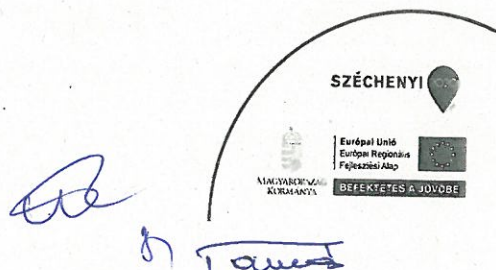
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Sió Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívására TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. szeptember 12-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Sió turisztikai fejlesztése (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

| | |
|--|---|
| Szervezet neve: | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Postacím: | 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. |
| Székhely: | 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 733568 |
| Adószám: | 15733562-2-17 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Ács Rezső polgármester |
| Számlavezető neve: | OTP Bank Nyrt. |
| Számlaszám: | 11746005-15416566-11670009 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Szervezet neve: | Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület |
| Postacím: | 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9. |
| Székhely: | 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 17-02-0001841 |
| Adószám: | 18020780-1-17 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Jámbor Attila elnök |
| Számlavezető neve: | OTP Bank Nyrt. |
| Számlaszám: | 11746005-20133968-00000000 |



A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. május 24-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.



A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átveteti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

| | Tag neve | Tevékenység | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege | A tevékenységre jutó támogatás összege |
|----|-----------------------------|---|---|--|
| 1. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Építés | 51 538 320 | 51 538 320 |
| 2. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Eszközbeszerzés | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 5. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Közbeszerzés | 500 000 | 500 000 |
| 6. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Projekt menedzsment személyi jellegű | 2 049 180 | 2 049 180 |


 T. ...

| | | ráfordítása | | |
|-----|--|--|------------|------------|
| 7. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása | 450 820 | 450 820 |
| 8. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Egyéb szolgáltatási költségek | 761 680 | 761 680 |
| 9. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása | 500 000 | 500 000 |
| 10. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Marketing; kommunikációs szolgáltatások | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 11. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Marketing, kommunikációs szolgáltatások | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 12. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Műszaki ellenőri szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 13. | Szekszárd MJV Önkormányzata | Tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 14. | Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület | Eszköz beszerzés | 20 000 000 | 20 000 000 |

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

| | Tag neve | Elszámolható költség | Támogatási összeg | Igényelt előleg |
|----|----------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Handwritten signature

Handwritten signature



| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 5. | | | | |
|----|--|--|--|--|

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

| | Tag neve | önrész formája | önrész összege | részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
|----|----------|----------------|----------------|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



Handwritten signature and initials.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a részes támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

Tauó 37



A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

.....

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.



7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

[Handwritten signature]
T. ...



A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.



10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szekszárdi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



.....
Ács Rezső
Név



Aláírás dátuma:

2017. 10. 27.

Konzorciumi Tag


.....
Jámbor Attila
Név

Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület

Szervezet
SZEKSZÁRDI KAJAK-KENU SE
7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9.
Adószám: 18020780-1-17
P.H.

Aláírás dátuma:

2017. 10. 30.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Támogatást igénylő | Beszerezés tárgya | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa | Megjegyzés |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--|------------|
| SZMJVÖ | Építési munkák költségei | 40.581.354 Ft | Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

SZÉCHENYI 2020



17
 T. a. a. a.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése az országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába.

A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára.

A Sió-projekt megvalósítása érdekében a Megye a megyei jogú város területén saját projektet tervez, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogat. A fejlesztés célja, szakmai és műszaki tartalma indokolja, hogy a megye számos településének turisztikai fellendülését biztosító Sió-projekt és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltató központ (bázis), valamint a turisztikai attrakció feltárását segítő hiányzó turisztikai célú kerékpárúti kapcsolatok kiépítésre kerüljenek. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel konzorciumban kívánja a megye és a megyei jogú város a projektet megvalósítani, melynek keretében egy új turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti településeken már meglévő és újonnan létesített megálló és kiszállók és a hozzájuk kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja. A fejlesztési elképzelés, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tulajdonában lévő, Szekszárd-Palánkon található, 3495 m² alapterületű telken (hrsz: 01633/3, közvetlenül a Sió parton) egy komplex turisztikai szolgáltató központ kerüljön kialakításra lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, kerékpár) segítségével a Sió és vonzáskörzetébe lévő települések bejárását, valamint környezeti és kulturális értékeinek megismerését. A tervezett létesítmény és kiegészítő elemei alternatívát nyújtana a vízi sportot, a természetet, a mozgást, vagy csak egyszerűen a közösségi életet kedvelőknek minden évszakban. A tervezett fejlesztés a Sió projekt II. üteme.

A Sió projekt első ütemét átfogó pályázat a Tolna Megyei Önkormányzat részéről már benyújtásra került a TOP turisztikai intézkedésére. Célja, hogy a Sión, a térségben egyedülálló vízi útvonal létesüljön, ahol mind az útvonal adottságai (nem hullámmzó, kis sodrású, nem mély), mind a már meglévő attrakciók összekötése valósuljon meg (Ozorai, Simontornyai vár, Sióagárdi pincefalu, Gemenci erdő stb.). Az attrakció párhuzamosan kiegészül a Sió menti kerékpárúttal is.

SZMJVÖ a projekt keretében a Sió vízi útvonal utolsó állomását fejlesztene, ahová nemcsak vízen, hanem kerékpárral, gyalog és autóval is érkehetnek a természetet, vizet, sportot és kikapcsolódást keresők. Az önállóan is támogatható tevékenységek között: szilárd burkolatú út épül a helyszínen, illetve a Sió megközelítése érdekében, parkolók létesülnek az érintett telken, biztosítjuk a terület ivóvízellátását, illetve építünk egy moduláris úszóművet. A kapcsolódó kiszolgáló létesítményekhez tartozik a fedett kerékpártároló és az udvari mozgásfejlesztő kiépítése. Az eszközbeszerzésen belül tervezünk túraeszközöket, játszótéri és szabadidős eszközöket, kültéri bútorelemeket és fedett kerékpár tárolókat. Az eszközbeszerzés adja a választható tevékenységek kialakítását, melyek közül például a tűzrakóhelyek vagy a hulladékgyűjtők az önállóan támogatható tevékenységekbe is beleférnek.

A pályázatot konzorciumban nyújtjuk be a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel, aki a túraeszközöket szerzi be, míg az egyéb felsorolt eszközöket illetve az építési projektelemeket SZMJVÖ valósítja meg. A megyei projekt keretében csak a szolgáltató központ belső berendezését



Handwritten signature and date: 1. április

foglalja magába az eszközbeszerzés. Az egyesület által beszerzett vízi túraeszközök Sió-túrák keretében lesznek a Sió és a vízi turizmus szolgálatába állítva, míg a kerékpárokkal a Sió mentén lehet túrát szervezni. A város eszközbeszerzésében a kerti bútorok a túra utáni pihenést teszi lehetővé, a mobil tűzhelyeknek köszönhetően sütni-főzni is lehet, a hulladékgyűjtők pedig a környezet tisztasága miatt elengedhetetlenek. A célcsoport bővítése érdekében, a kisebbek számára létesül az udvari mozgásfejlesztő játék és kapcsolódó kiszolgáló létesítményként a fedett kerékpártároló. A projekt keretében létesítendő kikötő és a megyei projekt többi Sió állomása is a csatorna vízi-turisztikai hasznosítását és megismerését szolgálja rekreációs céllal. A projekt egy komplex szolgáltatói rendszer a betervezett túrabázisokkal és túraközponttal együtt, ahova iskolásokat is ki lehet vinni, gyerekeket is lehet oktatni. A természet, a helyi értékek megközelítése és a helyi értékek megismertetése a cél vízi eléréssel, melynek következtében az autóhasználat is csökken, így környezetvédelmi szempontból is pozitív hatással bír a fejlesztés.

Együttműködési Megállapodás keretében teremtettük meg a szinergiát a megyei és a városi TOP projektek között már a tervezési szakaszban is. A két projekt együttes megvalósulása esetén térségi szintű turisztikai termékcsomag keletkezik, melynek megvalósíthatóságát is támogatja a forrásmegosztás. SZMJVÖ támogatási kérelme azonban önállóan is életképes. A projekt multiplikatív hatása a munkahely teremtés mellett a város bevételeit is növeli, mivel a vendégéjszakák száma nő a fejlesztés komplexitása révén.

A Felhívás 3.2 pontja alapján a fejlesztés helyi infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás a 255/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet 4§2. társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés alá esik. A Tolna Megyei Önkormányzat Sió fejlesztésével együttesen egy térségi-megyei szintű turisztikai termékcsomag valósul meg, melyen belül SZMJVÖ a szekszárdi kikötőállomás és környező infrastruktúrájának a fejlesztését vállalta. A helyi, korábban kiaknázatlan vízi turisztikai attrakciót jelentő Sió turisztikai hasznosítása gazdaságélénkítő hatással bír, megnöveli a vendégéjszakák számát és fenntartható megoldást nyújt rekreációs időtöltésre.

A fejlesztés elsődleges helyszíne a szolgáltató központ területe (megyei projektből épül), ahol a városi projektből parkoló, játszótér és kikötőállomás létesül. A további helyszínek a kiszolgáló infrastruktúrát jelölik; vízvezeték és út által érintettek a megjelölt helyrajzi számok.

A megvalósításhoz szükséges szakmai háttér biztosítva van 3 tagú projektmenedzsmenttel és turisztikai munkatárssal-meglévő HR kapacitás formájában.

A fejlesztés kínálati elemei széles spektrumúak a célcsoportok tekintetében: a Sió-túrák minden korosztály számára lehetőséget nyújtanak a szabadidős, egészségmegőrző turisztikai időtöltés tekintetében. A kerékpáros megközelítés biztosítása mellett udvari mozgásfejlesztő eszköz kerül telepítésre a gyerekek számára, illetve a kerti bútorok, tűzhelyek további időtöltést tesznek lehetővé a túrát követően annak érdekében, hogy a látogatók várható tartózkodási ideje egész napos legyen.

A fejlesztés a megye projektjével együtt biztosítja azt a komplexitást, melynek köszönhetően legalább 270 napos nyitva tartás valósul meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

P. H. Illés




8

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

1. Hrsz.: 01633/3
2. Hrsz.: 01632/2
3. Hrsz.: 01635
4. Hrsz.: 01637
5. Hrsz.: 01626/2


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső** (*hivatalos képviselő neve*), mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Sió turisztikai fejlesztése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

A) ...¹ mérföldköig a kommunikációs tervet benyújtjuk.

vagy²

B) kommunikációs terv készítése jelen projekt esetében nem elvárás.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

¹ Kérjük szíveskedjenek a vállalást megadni. A projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység megvalósítása kizárólag a kommunikációs terv Támogató általi jóváhagyása után kezdődhet.

² A vagy B pont, a nem releváns rész törlendő

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 100.000.000.- Ft

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| Kiemelt jelentőségű projekt | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg | |
| Infrastrukturális fejlesztés | 150 millió Ft alatti | X |
| | 150-500 millió Ft | |
| | 500 millió Ft feletti | |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti | |
| | 150-500 millió Ft | |
| | 500 millió Ft feletti | |

| Feladatok | | Igen* | Nem* |
|--|--|--------------|-------------|
| A projekt előkészítő szakasza (1–4.) | | | |
| A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) | | | |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) | | | |
| 1 | Kommunikációs terv készítése | | X |
| 2 | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése | | X |
| 3 | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | X | |
| 4 | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | | X |
| 5 | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) | | X |
| 6 | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | C | |
| 7 | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan | | X |
| 8 | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése | X | |
| 9 | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | | X |
| 10 | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | X | |
| 11 | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | | X |
| 12 | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | X | |
| 13 | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | | X |


 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.

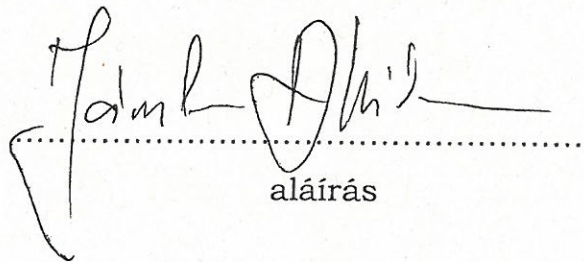
* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

SZÉCHENYI 2020



Aláírási címpéldány


Alulírott, **Jámbor Attila** (születési hely: Budapest, születési idő: 1974.07.31, anyja neve: Almási Julianna, személyi igazolvány száma: 673838 LA) 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9. szám alatti lakos mint a **Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület** (székhely: 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9.) igazgatója, az egyesületet akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá nevemet önállóan, minden korlátozástól mentesen az alábbiak szerint írom alá:


aláírás

Vicze Lászlóné dr. Koleszár Olga
szekszárdi közjegyző
7100 Szekszárd, Csonka u.5.
Ügyszám: 440.15/H/477/2013

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy az általam személyesen ismert **JÁMBOR ATTILA** (1974., Almási Julianna) 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9. szám alatti lakos ezt az okiratot előttem saját kezűleg írta alá.-----
--Kelt Szekszárdon, a 2013. Kettőezer-tizenharmadik év április hó 18. tizennyolcadik napján-----




Vicze Lászlóné Dr. Koleszár Olga
közjegyző


Tavasz

Vicze Lászlóné dr. Koleszár Olga
szekszárdi közjegyző
7100 Szekszárd, Csonka u.5.
Ügyszám: 44015/H/321/2016

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy ez a fénymásolat az előttem eredetiként felmutatott 44015/H/477/2013 ügyszámú közjegyzői tanúsítvánnyal hitelesített, egy oldal terjedelmű aláírási címpéldány fénymásolata.-----

----A közjegyző az elkészíteni kért záradéki tanúsítványt nyomban kiállította, ezért az alakszerű kérelem előterjesztésétől a Kjtv. 172. §. (2) bekezdésének megfelelően eltekintett.-----

----Kelt Szekszárdon, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év április hó 18. (tizennyolcadik) napján-----



[Handwritten signature]
Vicze Lászlóné Dr. Koleszár Olga
közjegyző

[Handwritten signature]
Taus

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

A projekt keretében valamennyi tevékenységet utófinanszírozás keretében kívánunk megvalósítani.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt Szekszárd, 2017. október 30.





Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Szekszárd, 2017. október 30.



Handwritten signature in blue ink.

